

河间市沙河桥镇 571 线路新建变压器工程 “4·6”一般触电瞒报事故调查报告

2023 年 4 月 6 日 14 时 30 分左右，河间市沙河桥镇 571 线路东官道村新建变压器工程低压线路切改作业过程中，发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 247 万元。事故发生后，事故单位未依法上报应急管理部门及负有安全监管职责的有关部门，经群众举报后核查属实。

经调查认定，这是一起违规组织施工作业引发的一般触电瞒报生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目概况

河间市沙河桥镇东官道村位于沙河桥镇区东南方向，地处新老子牙河之间。距离沙河桥镇政府所在地 6.5 公里。村内有南北大街一条，东西大街一条。

东官道村原有 100KVA 变压器一台，位于东官道村东部，近年来由于村民多处安装光伏发电装置，造成原有变压器反向负荷超载，根据 2022 年 12 月《河间 10KV 留农 5424 线路大车东北配变改造工程科研及初设一体化设计报告》，2023 年年初河间供电分公司计划在东官道村增建一台 100KVA 变压器。

（二）事故相关单位概况

1. 沧州中兴实业集团有限责任公司（以下简称沧州中兴集团公司）为施工总承包单位。该公司成立于 2003 年 9 月 2 日，位于沧

州市运河区北环西路 8 号，法定代表人黄某，注册资金 8516 万人民币，统一社会信用代码*****，类型为有限责任公司，经营范围：承装、承修、承试电力设施二级；送变电工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、房屋建筑工程、计算机网络系统工程、管道工程施工；送变电工程勘测、设计；电力设备运行及线路维护；通信设施维护；电力技术咨询、服务；新能源技术开发及推广服务等。

2019 年 7 月 29 日，取得承装（修、试）电力设施许可证，证书编号为*****；许可类别和等级：承装类二级、承修类二级、承试类二级；有效期限：自 2019 年 7 月 23 日始，至 2025 年 7 月 22 日止。

2021 年 12 月 31 日，取得建筑业企业资质证书，证书编号*****，有效期至 2026 年 12 月 30 日。资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，电力工程施工总承包壹级。

2022 年 3 月 18 日，取得安全生产许可证，证书编号为（冀）J*****，许可范围：建筑施工，有效期至 2025 年 3 月 17 日。

2. 沧州中兴实业集团有限责任公司河间工程分公司（以下简称中兴河间分公司）隶属沧州中兴集团公司。该公司成立于 2012 年 12 月 7 日，位于河间市曙光西路，负责人惠某某，统一社会信用代码 911309840594313157，经营范围：送变电工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程施工（以上经营范围以资质证书为准），

送变电工程勘测、设计，变电站运行维护，电力线路维护，通讯设施维护。

3. 双安电力工程有限公司（以下简称双安电力公司）为施工分包单位。该公司成立于 2018 年 10 月 31 日，位于河北河间经济开发区（西区），法定代表人傅某，注册资金 5000 万人民币，统一社会信用代码:91130984MA0CUX0E6G，经营范围：电力工程勘察设计、施工，电力设备销售、安装及维修，太阳能发电、风力发电、电力系统设计服务，售电服务，电力咨询服务，建筑劳务分包。营业期限为自 2018 年 10 月 31 日至 2038 年 10 月 30 日。

2020 年 7 月 10 日，取得安全生产许可证，证书编号为（冀）J*****，许可范围：建筑施工，有效期至 2023 年 7 月 10 日。

2021 年 4 月 1 日，取得建筑企业资质证书，证书编号为*****，资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级，电力工程施工总承包叁级，有效期至 2024 年 10 月 25 日。

2021 年 10 月 14 日，取得承装（修、试）电力设施许可证，证书编号为*****，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期限：自 2019 年 10 月 14 日始，至 2025 年 10 月 13 日止。

2021 年 10 月 22 日、2022 年 10 月 18 日，双安电力公司法定代表人傅某分别通过视频形式授权位某为双安电力公司合法代理人，全权负责在河间供电分公司、中兴河间分公司备案的相关事宜，全权代表双安电力公司在业务办理中的相关事宜，代表双安电力公司按规定提交相关资料和办理相关事宜。

经查，2022 年双安电力公司中标中兴河间分公司的全部 5 个劳务分包工程，均由位某带领人员组织施工。2023 年以来，位某继续组织人员对 2022 年未竣工的分包工程项目进行施工。

4.国网河北省电力有限公司河间市供电分公司（以下简称河间供电分公司）为建设单位。该公司成立于 2015 年 11 月 25 日，位于河北省沧州市河间市曙光路中北侧，类型为有限责任公司分公司，负责人张某某，统一社会信用代码*****，经营范围：电力销售；自有设备租赁，自有房屋租赁。该公司现有员工 448 人。设有职能部门 8 个，业务支撑和实施机构 2 个，12 个供电所。

电网规模：河间市境内共有 500 千伏变电站 1 座，220 千伏变电站 2 座，110 千伏变电站 10 座，35 千伏变电站 20 座，主变 44 台，总容量为 434.1 兆伏安，10 千伏开闭所 1 座。35 千伏线路 40 条，总长度 335.1 公里。10 千伏线路 238 条，总长度 3836.6 公里。

（三）事故相关单位关系情况

1.河间供电分公司与沧州中兴集团公司、中兴河间分公司关系。

中兴河间分公司是沧州中兴集团公司下属分公司，中兴河间分公司主要负责沧州中兴集团公司承包的河间供电分公司的建设、检修、应急等工程项目。

2023 年 2 月 14 日，河间供电分公司与沧州中兴集团公司签订《（检修/技术改造）施工合同》及安全协议，将 2023 年度河间供电分公司检维修任务发包给沧州中兴集团公司，依据合同约定，该工程为施工总承包模式，并在安全协议中约定，由乙方中兴集团公

司对施工安全负总责，责任和相关费用均由中兴集团公司承担。该项目具体实施单位是中兴河间分公司。

2. 沧州中兴集团公司、中兴河间分公司与双安电力公司关系。

根据沧州中兴集团公司有关规定，2021年8月19日，双安电力公司向沧州中兴集团公司上报了2022年分包单位资质和条件报审材料。2022年2月25日，沧州中兴集团公司印发了《关于发布沧州中兴实业集团有限责任公司备选分包商资格的通知》，该《通知》备选分包商名录中含双安电力公司。

2023年2月6日，双安电力公司向沧州中兴集团公司上报了2023年分包单位资质和条件报审材料。2023年3月21日，沧州中兴集团公司印发了《关于发布沧州中兴实业集团有限责任公司备选分包商资格的通知》，该《通知》备选分包商名录中含双安电力公司。

经查，2022年，双安电力公司共中标中兴河间分公司5个劳务分包工程，中兴河间分公司分别于2022年12月31日、2023年4月8日将其中一起已完成分包工程的款项汇入双安电力公司账户。

3. 河间市邦维电力工程有限公司与相关单位关系。

经查，河间市邦维电力工程有限公司（以下简称邦维公司）与死者王某家属签订了赔偿协议书。

邦维公司成立于2022年2月21日，公司统一社会信用代码*****，注册资金100万人民币，法定代表人孙某。位某、孙某各占股50%。经查，自该公司成立起，邦维公司与双安电力公司、中兴河间分公司均无业务、资金往来。

（四）东官道村新建变压器工程施工情况

3月下旬，河间供电分公司运维部项目部管理人员王某某通知中兴河间分公司总经理惠某某，东官道村需新建100KVA变压器一台、架设一段10KV高压线（新建变压器至村北机井处）等工作，惠某某安排张某某（中兴河间分公司分管项目建设人员）负责这项工作。

3月29日上午，张某某联系双安电力公司施工队负责人位某负责东官道村新建变压器项目。当日下午位某、张某某和沙河桥供电所所长刘某某等人现场勘查，确定新建变压器安装位置（东官道村委会东侧），同时，对现场的工作内容和危险点进行详细记录。

3月30日，位某安排施工队长崔某带领解某某、郭某某、王某（事故死者）、孙某某到东官道村施工现场。在刘某某、张某某监督指导下，安装一台变压器，改造原有0.4KV低压架空线路，架设一条10KV架空线路。当日工作完成，崔某自行安排人员对新架设10KV线路合闸送电，新建变压器未投运。直到4月6日中午前未再进行施工。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月6日，位某安排崔某等人当天下午去沙河桥镇东官道村对新建变压器进行低压切改工作，位某告知崔某施工前联系供电所工作人员并告知其联系电话。当日13时左右，崔某带领王某、解某某、郭某某、孙某某到达东官道村低压线路切改工作现场。到达现场后，崔某联系位某提供的沙河桥供电所联系人，电话未能接通。崔某认为工作量小，在中兴河间分公司及沙河桥供电所人员未到现场的情况下自行决定开始施工，之后组织召开班前会并现场

宣读该单位内部工作票内容，讲解现场危险点、安全措施以及人员分工。

13 时左右，崔某将东官道村东侧变压器上的跌落开关和电闸进行分断。做好接地等安全措施后，孙某某负责将新建变压器 JP 柜下的线路接到柜内电闸上；王某和解某某、郭某某负责把东部变压器附近线路剪断并回收。王某和郭某某切断线后自行到新建变压器现场。

14 时 30 分左右，施工队队员王某发现低压配电柜上方电缆头存在问题，自行上杆修理，上杆过程中王某进入带电高压线危险区域。崔某在距离变压器大概十几米的位置，听见叫声，看见王某挂在新建变压器北侧线杆跌落开关附近，身体向东北方向后仰，腰间抱杆带挂在从地面由下到上第四个横担上方（见图 2）。

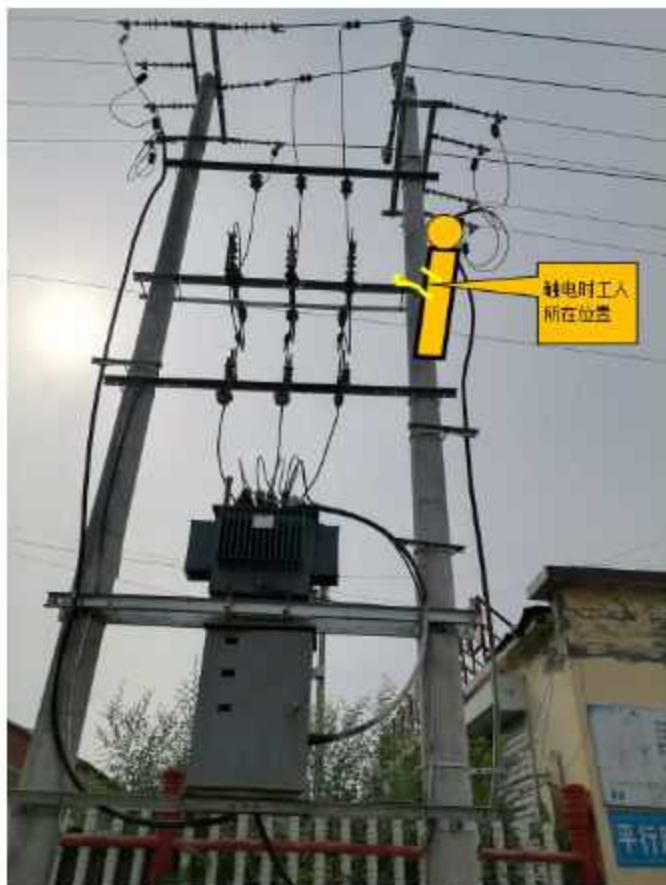


图 2 施工人员触电位置示意图（跌落开关上口带电 10KV）

（二）事故救援处置及上报情况

崔某发现王某触电后，立即打电话向位某汇报并赶去村北机井处将 10KV 的隔离开关分断，回到事故现场和孙某某、解某某上杆施救，用绳子将王某送到地面后，进行心肺复苏急救。同时，在事发现场的郭某某拨打 120 急救电话。考虑事发地点距离医院较远，孙某某、解某某、郭某某开车将王某送到医院，在付位庄村附近与 120 救护车相遇，将王某转移至 120 救护车送到河间市医院救治，经医院救治无效于 17 时许死亡。

事故发生后，位某未向双安电力公司法定代表人傅某、中兴河间分公司、河间供电分公司、河间市应急管理局及河间市发改局报告事故情况。4 月 9 日，位某以邦维公司名义与死者王某家属签订了赔偿协议书并进行了赔偿，随后，死者王某火化后埋葬。

（三）天气情况

根据河间市气象观测站观测数据，2023 年 4 月 6 日 14 时-15 时，河间市沙河桥镇气温 13.9-15.2℃，无降水，极大风速 4.4-4.8m/s，风力 3 级。

（四）事故核查情况

2023 年 5 月 15 日，沧州市应急管理局接到关于 4 月 6 日河间市供电公司发生一起触电事故的举报信件，立即责成河间市政府组织核查，经核查认定，这是一起造成 1 人死亡的一般生产安全事故，事故发生后，企业未按规定上报，瞒报事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

王某攀爬新建变压器北侧线杆维修作业过程中，违规进入带电 10KV 高压线路安全距离（0.35 米）内，发生触电导致死亡。

（二）事故间接原因

1. 双安电力公司落实企业主体责任不到位，违规施工作业。新建 10KV 线路未经验收即合闸送电；未经批准，私自进行低压切改作业，施工作业未办理工作票；现场施工人员未取得电工特种作业操作证带电作业。

2. 中兴河间分公司安全管理不到位。未与分包单位双安电力公司签订安全管理协议即安排施工作业；作为施工总承包单位，履行安全协调管理职责不到位，对施工现场发生事故负有责任。

四、相关单位存在的主要问题

（一）企业层面

1. 双安电力公司。事故发生后，未履行事故上报义务，该公司相关人员未向主要负责人报告事故情况，也未向河间市应急管理局及河间市发改局上报事故。

2. 沧州中兴集团公司。作为工程施工总承包单位，对中兴河间分公司履行安全协调管理职责不到位情况失察，对劳务分包单位安全管理不到位。

（二）管理层面

1. 沙河桥供电所。履行管理职责不到位，未发现新建变压器及配套线路未经验收即送电情况；未发现辖区内相关人员擅自对低压线路进行切改。

2. 河间供电分公司。对沙河桥供电所履职不到位情况失察。

（三）监管部门层面

河间市发改局。作为行业监管部门，未制定并提出行业监管措施，履行行业监管职责不力。

五、责任追究建议

（一）建议给予行政处罚的责任人员

1. 傅某，双安电力公司法定代表人。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，建议由河间市应急管理局依法对其给予上一年度收入 40% 罚款的行政处罚。

2. 位某，双安电力公司施工负责人。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项，建议由河间市应急管理局依法对其给予行政处罚。

3. 崔某，东官道村变压器施工现场负责人。依据《河北省安全生产条例》第七十九条第（二）项，建议由河间市应急管理局依法对其给予行政处罚。

4. 惠某某，中兴河间分公司主要负责人。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项，建议由河间市应急管理局依法对其给予上一年度收入 40% 罚款的行政处罚。

（二）对有关人员的处理建议（7 人）

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关单位的公职人员履职方面问题的相关材料，事故调查组已移交纪委监委追责问责组。纪检监察机关按照干部管理权限，对河间市发改局、河间供电公司 7 名责任人员，依规依纪依法严肃追究责任。

（三）建议给予行政处罚的单位

1. 双安电力公司。对事故发生和瞒报负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，建议由河间市应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

2. 沧州中兴集团公司。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项，建议由河间市应急管理局依法对该公司给予行政处罚。责成该公司向沧州市供电公司作出深刻检查。

（四）对其他有关单位的处理建议

责成河间供电分公司向沧州市供电公司作出深刻检查；责成河间市发改局向河间市人民政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一） 提高思想认识，压实安全生产职责

河间市委、市政府，各部门、各乡镇要切实提高思想认识，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，以时时放心不下的责任感，牢牢守住安全生产的底线红线。要按照“三管三必须”要求，层层压实党委政府属地责任、部门监管责任和企业主体责任。河间市发改局要落实电力行业监管责任。要依照安全生产相关法律法规要求，采取针对性措施，指导和督促企业健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实安全生产主体责任。

（二） 加强安全管理，落实电力施工主体责任

河间供电分公司、中兴河间分公司、双安电力公司及其他有关电力建设、施工单位要严格落实安全生产主体责任，加强本单位安全生产管理，严格落实安全生产各项规章制度，对特种作业人员持证上岗作业严格管理，严格执行作业票制度；进一步加强安全教育培训工作，强化员工三级安全教育培训管理，提升从业人员岗位安全知识，树立安全防范意识；教育和督促员工遵守制度规程，杜绝“三违”现象的发生；特别是要加强对施工作业现场的监督，坚决

杜绝在项目发包、作业监管监护、竣工验收等环节中有法不依、有章不循的情况，确保现场安全防护措施落实到位。

（三）强化执法监管，严厉打击非法违法行为

河间各级各有关部门要坚持问题导向，扎实开展治本攻坚三年行动，对本地区本行业领域安全风险隐患开展分析研判，采取有效措施推动本地区安全生产形势持续稳定向好。要充分运用“四不两直”、明察暗访、异地交叉执法等方式聚焦重大隐患排查整治，深入推进精准执法；要进一步加大现场执法检查力度，完善“双随机”抽查检查工作机制，严防小施工、小作业惹大事。对严重违法行为依法采取停业整顿、关闭取缔、上限处罚、联合惩戒、“一案双罚”等手段，严厉打击各类安全生产非法违法行为，有效遏制各类事故发生。

（四）汲取事故教训，加大瞒报事故打击力度

河间市委、市政府，各部门、各乡镇要认真汲取本次事故教训，深刻意识到瞒报事故的危害性，加大安全生产宣传教育力度，让企业负责人和相关人员熟知依法上报事故的规定和流程，杜绝侥幸心理，促使企业依法依规上报事故情况。要加大对省、市安全生产举报奖励制度的宣传，持续开展宣传“五进”活动，加强对重点行业、重点领域和重点人群的宣传，不断提升群众参与安全生产工作的积极性。要综合运用执法检查、有奖举报等多种手段，加大对瞒报生产安全事故行为打击力度，做到有报必查，查实重处，营造不敢瞒的高压态势，打造不能瞒的约束机制，促使相关企业及人员依法依规上报事故，防止各类瞒报、谎报、漏报、迟报事故的发生。
